PROYECTO FINAL · SOLUCIONES PARA EL CLENA

Inception

Actas de las reuniones de Inception de la Entrega 1

Nombre del equipo	Equipo P5
Proyecto elegido	P5 · Memoria Digital del Atlántico: digitalización, inventario y portal web del Archivo Histórico
Equipo de origen	Introducción a la Ingeniería, grupo 7: Santiago Barros, Iván Gómez, Samuel Pimienta y Juan Riaño
Repositorio	https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico
Tablero de GitHub Projects	https://github.com/users/suscantillo/projects/1
Integrantes	Andrea De la Ossa (Product Owner), Jesús Cantillo Guerrero (Scrum Master), María Gutiérrez y Alejandro Alonso (Development Team)
Curso	Aplicaciones Web Backend · Universidad del Norte
Fecha y versión	13 de noviembre de 2026 · versión 1.0 · Entrega 1

Índice

1. Introducción 3

2. Acta de inception con el equipo de Introducción (27 de octubre de 2026) 5

3. Acta de inception del equipo (7 de noviembre de 2026) 9

1. Introducción

Este documento reúne las dos reuniones de Inception del proyecto. En la primera, el equipo de Introducción a la Ingeniería (grupo 7) presentó el problema que identificó en su visita al CLENA y el material de su análisis. En la segunda, el equipo de desarrollo acordó la visión, los objetivos de la entrega 1, los roles, el alcance, los acuerdos de trabajo y el backlog inicial.

Reunión	Fecha	Medio	Grabación
Inception con el equipo de Introducción	Martes 27 de octubre de 2026, 1:00 p. m.	Microsoft Teams	Ver grabación
Inception del equipo	Sábado 7 de noviembre de 2026, 5:27 p. m.	Microsoft Teams	Ver grabación

Los enlaces a todas las grabaciones están también en `docs/evidencias.pdf`. La versión en Markdown de cada acta está en `docs/actas/`.

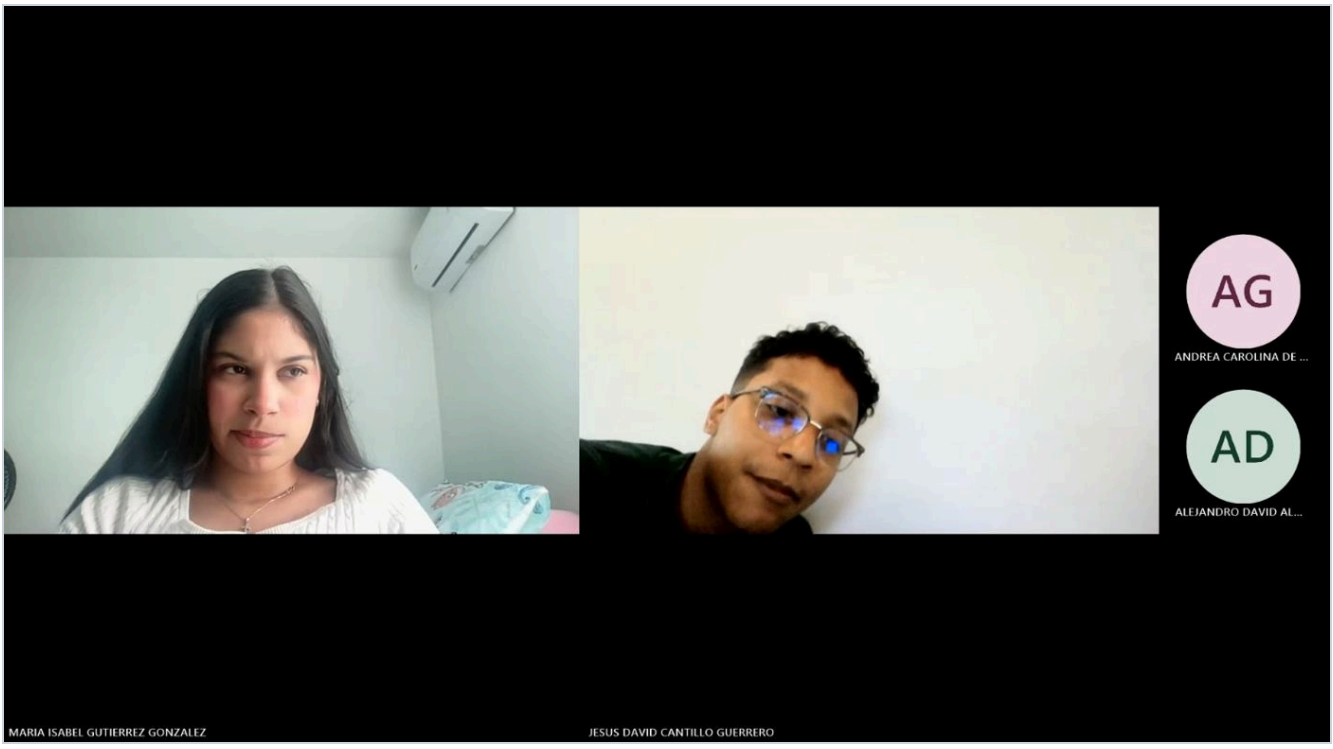


Figura 1. Reunión de Inception con el equipo de Introducción en Microsoft Teams (27 de octubre de 2026).

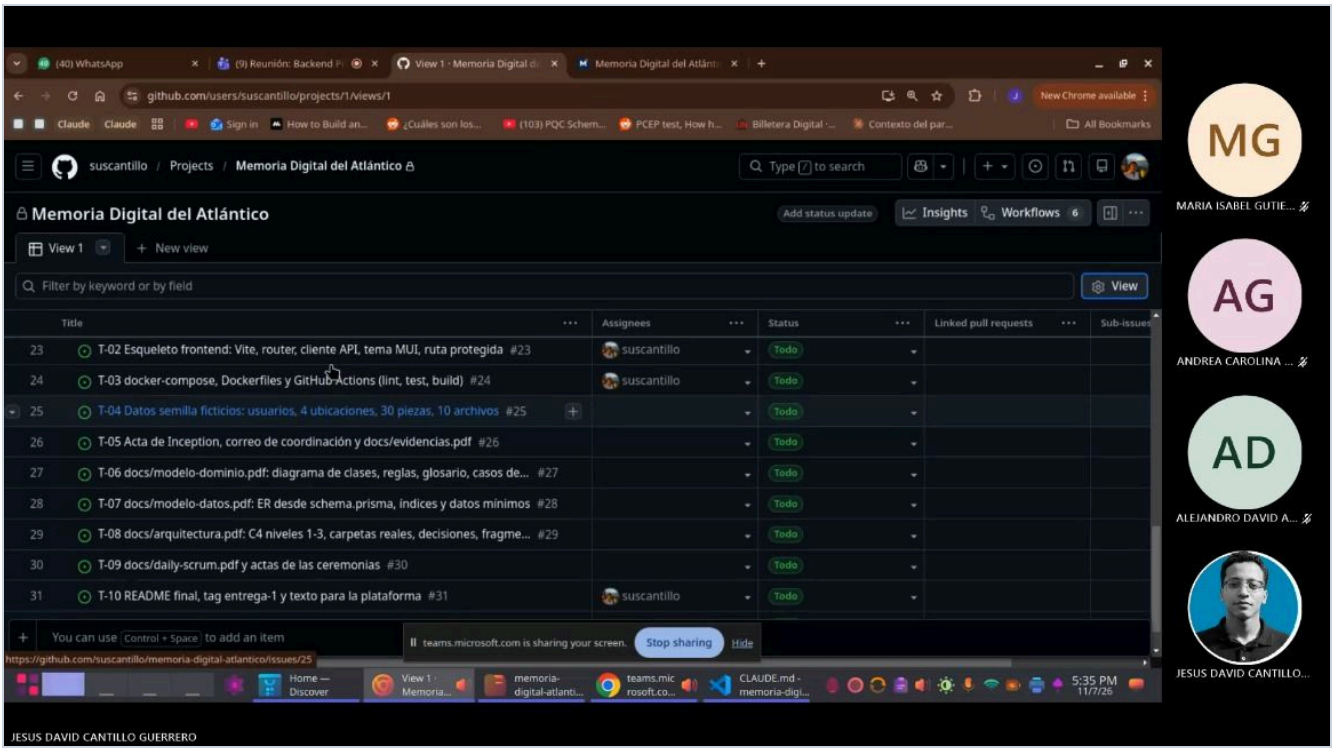


Figura 2. Reunión de Inception del equipo en Microsoft Teams (7 de noviembre de 2026, 5:35 p. m.): Jesús Cantillo comparte el backlog inicial en el tablero de GitHub Projects.

2. Acta de inception con el equipo de Introducción (27 de octubre de 2026)

Campo	Valor
Fecha	27 de octubre de 2026, 1:00 p. m.
Duración	14 minutos con 23 segundos
Lugar / medio	Microsoft Teams. Jesús se conectó desde la universidad junto con el equipo de Introducción, en el mismo computador
Asisten	Andrea De la Ossa, Jesús Cantillo Guerrero, María Gutiérrez, Alejandro Alonso. Del equipo de Introducción (grupo 7): Santiago Barros, Iván Gómez, Samuel Pimienta y Juan Riaño
Facilita	Jesús Cantillo Guerrero

Visión del producto

Para investigadores, estudiantes y el personal del Archivo Histórico del Atlántico, Memoria Digital del Atlántico es un archivo digital para saber qué documentos existen y consultarlos sin manipular los originales. Cada pieza se inventaría y se escanea una sola vez.

Santiago Barros presentó el problema que el equipo de Introducción identificó en su visita al CLENA, el 26 de septiembre de 2026:

- Los originales son antiguos y frágiles, y cada consulta implica manipularlos.
- No hay un registro en línea de lo que guarda el archivo. Para saberlo, hay que ir en persona y depender del personal.

El equipo de Introducción compartió:

- su informe final del laboratorio de campo, del 14 de octubre de 2026;
- su presentación;
- su repositorio, https://github.com/Jrianopro20/clena-biblioteca-piloto, con el backlog del análisis.

El proyecto parte de ese material, y el equipo de origen valida el backlog (#32).

Objetivos de la entrega

#	Objetivo	Cómo sabremos que se cumplió
1	Inventario digital: cada pieza con código único `MDA-AAAA-NNNN` y su ubicación física	#5, #6, #7 y #8 cerrados con su PR fusionado
2	Digitalización con control de calidad antes de publicar	#9 y #10 cerrados
3	QR por pieza y portal público de consulta	#11, #12, #13, #14 y #15 cerrados
4	Cuentas, roles y datos personales según la Ley 1581	#1, #2, #3, #4 y #17 cerrados
5	Entrega 1 documentada y etiquetada	#26 a #31 cerrados y tag `entrega-1` antes del viernes 13 de noviembre a las 9:00 a. m.

Roles y responsabilidades

Integrante	Rol Scrum	Responsabilidades
Andrea De la Ossa	Product Owner	Prioriza el backlog. Revisa la documentación y prueba los criterios Dado/Cuando/Entonces antes de aprobar PR funcionales. Desarrolla cuentas, sesión, ubicaciones y piezas (#2, #4, #5, #6, #8, #17).
Jesús Cantillo Guerrero	Scrum Master, Development Team (backend y frontend)	Facilita las ceremonias. Arma la base técnica (#22, #23, #24) y desarrolla registro, inventario, escaneos, calidad y portal (#1, #7, #9, #10, #13, #15). Cierra la entrega (#31).
María Gutiérrez	Development Team (frontend)	Sistema de diseño (#16), autorización por roles (#3), QR y ficha pública (#11, #12, #14), semillas (#25), acta de Inception y evidencias (#26) y arquitectura (#29).
Alejandro Alonso	Development Team (backend)	QR y ficha pública desde el backend (#11, #12) y funciones de prioridad baja (#20, #21).

Alcance

Entra:

- Inventario digital de las piezas y sus ubicaciones en depósito, estantería y caja (#5, #6, #7, #8).
- Carga de escaneos con metadatos y control de calidad (#9, #10).
- QR de cada pieza para pegar en su carpeta o caja (#11), que abre su ficha pública (#12).
- Portal público con búsqueda, visor y ubicación del original (#13, #14, #15).
- Cuentas y roles `ADMIN`, `PERSONAL` y `PUBLICO` (#1, #2, #3, #4, #17).
- Sistema de diseño (#16).

No entra (por ahora):

- Asistente de recomendaciones (#21), hasta que lo valide el equipo de origen.
- QR en las vitrinas de la Galería y OCR de los documentos, que la propuesta deja para fases posteriores.
- Lotes de trabajo para voluntarios (#19) e impresión de etiquetas por lote (#20), con prioridad baja.

Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Datos personales en algunos registros y en las cuentas de usuario	Media	Alto	Aviso de privacidad y consentimiento (#1). Consulta y eliminación de los propios datos (#4). Datos de prueba ficticios (#25).
Publicar escaneos ilegibles o de una pieza equivocada	Media	Alto	Control de calidad obligatorio antes de publicar (#10)
Que se perjudique el original durante el escaneo	Media	Alto	Escanear cada documento una sola vez y conservar el archivo digital (#9)

Acuerdos de trabajo

- Dailies: por Microsoft Teams.
- Canal de comunicación: Microsoft Teams y los issues y PR de GitHub.
- Definición de terminado: ver CONTRIBUTING.md.
- Criterio para cambiar el glosario: un PR `docs:` que toque a la vez el glosario, el dominio, Prisma, la API y la UI (CONTRIBUTING.md).
- Cada cambio va en una rama `feat/<issue>-descripcion` y entra a `main` por PR, con una aprobación, la CI en verde y `Closes #n`.
- Revisión cruzada de PR entre Alejandro y María.
- Stack fijo: NestJS 10, Prisma y PostgreSQL 16 en el backend; React 18, Vite y MUI en el frontend; Docker.

Backlog inicial

Issue	Historia / tarea	Puntos	Prioridad
#1	HU-01 Registro con aviso de privacidad y consentimiento	5	Alta
#2	HU-02 Iniciar, renovar y cerrar sesión con JWT	5	Alta
#3	HU-03 Autorización por roles en API y frontend	5	Alta
#4	HU-04 Ver mis datos y eliminar mi cuenta (Ley 1581)	3	Alta
#5	HU-05 Gestionar ubicaciones (depósito, estantería, caja)	3	Alta
#6	HU-06 Registrar una pieza con código único	5	Alta
#7	HU-07 Listar el inventario con filtros, paginación y orden	5	Alta
#8	HU-08 Ver y editar la ficha interna de una pieza	3	Alta
#9	HU-09 Cargar el escaneo de una pieza con metadatos	8	Alta
#10	HU-10 Control de calidad: aprobar o rechazar escaneos	8	Alta
#11	HU-11 Generar y descargar el QR de una pieza	3	Alta
#12	HU-12 Abrir la ficha pública desde el QR	3	Alta
#13	HU-13 Buscar piezas publicadas por metadatos	5	Alta
#14	HU-14 Ver la ficha pública con visor y ubicación del original	3	Alta
#15	HU-15 Documentos en PDF solo con cuenta y piezas restringidas	3	Alta
#16	HU-16 Aplicar el sistema de diseño	3	Alta
#17	HU-17 Administrar cuentas del personal	5	Media
#18	HU-18 Contadores y avance de digitalización en el inventario	3	Media
#19	HU-19 Lotes de trabajo para voluntarios	8	Baja
#20	HU-20 Imprimir etiquetas QR de varias piezas	3	Baja
#21	HU-21 Asistente de recomendaciones	8	Baja
#22 a #24	T-01 a T-03 Esqueleto del backend y del frontend, docker-compose y CI	—	Alta

Issue	Historia / tarea	Puntos	Prioridad
#25	T-04 Datos semilla ficticios	—	Alta
#26 a #31	T-05 a T-10 Documentación y cierre de la entrega 1	—	Alta

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Validar el backlog (#32)	Equipo de Introducción	Entrega 1
Esqueleto del backend, del frontend, docker-compose y CI (#22, #23, #24)	Jesús Cantillo Guerrero	Entrega 1
Datos semilla ficticios (#25)	María Gutiérrez	Entrega 1
Acta de Inception, correo de coordinación y evidencias (#26)	María Gutiérrez	Entrega 1
Arquitectura (#29)	María Gutiérrez	Entrega 1
Actas de las ceremonias (#30)	María Gutiérrez	Jueves 12 de noviembre
README final y tag `entrega-1` (#31)	Jesús Cantillo Guerrero	Viernes 13 de noviembre, 9:00 a. m.

3. Acta de inception del equipo (7 de noviembre de 2026)

Campo	Valor
Fecha	Sábado 7 de noviembre de 2026, de 5:27 p. m. a 6:12 p. m.
Lugar / medio	Microsoft Teams
Asisten	Andrea De la Ossa, Jesús Cantillo Guerrero, María Gutiérrez, Alejandro Alonso
Facilita	Jesús Cantillo Guerrero

Visión del producto

Para investigadores, estudiantes y el personal del Archivo Histórico del Atlántico, Memoria Digital del Atlántico es un archivo digital para saber qué piezas existen, dónde están y consultarlas sin manipular los originales. Más adelante tendrá una búsqueda asistida por IA que recomiende qué documentos sirven para un tema, por ejemplo la historia del Carnaval.

Jesús presentó el repositorio ya montado: la rama `main`, el backend en NestJS con Clean Architecture (aplicación, dominio, infraestructura y presentación), el frontend de prueba, Docker, la carpeta `docs/` con las actas y sus plantillas, y las reglas del repositorio. Las historias de usuario se basaron en el documento y el flujo de pantallas de María.

Objetivos de la entrega

Entrega del viernes 13 de noviembre a las 9:00 a. m. Se presentan cuatro funcionalidades:

#	Objetivo	Cómo sabremos que se cumplió
1	Inventario de piezas con su ubicación física y su estado de digitalización	#5, #6, #7 y #8 terminados
2	Carga de escaneos y cola de control de calidad para aprobarlos o rechazarlos	#9 y #10 terminados
3	Vínculo físico-digital por QR: descargar el QR de una pieza y ver la pieza al escanearlo	#11 y #12 terminados
4	Portal público de búsqueda por metadatos	#13, #14 y #15 terminados

Antes van las historias transversales, que no son funcionalidades pero se necesitan: registro (#1), sesión con JWT (#2), autorización por roles (#3) y datos personales (#4).

Roles y responsabilidades

Los roles los pide el profesor. Jesús los asignó así:

Integrante	Rol Scrum	Responsabilidades
Andrea De la Ossa	Product Owner	Responde como dueña del producto.
Jesús Cantillo Guerrero	Scrum Master	Revisa y prueba a mano cada PR antes de fusionarlo. Toma las historias transversales: registro, sesión y usuarios.

Integrante	Rol Scrum	Responsabilidades
María Gutiérrez	Development Team (frontend y backend)	Avisa si alguna historia se aparta del flujo de pantallas que diseñó. Hace las actas de las reuniones.
Alejandro Alonso	Development Team (frontend y backend)	Desarrolla las historias que se asigne.

Por el tiempo, todos trabajan frontend y backend.

Alcance

Entra:

- Las cuatro funcionalidades de la entrega 1 y las historias transversales (#1 a #15).

No entra (por ahora):

- La búsqueda asistida por IA queda para la entrega final (#21). Para esta entrega, la búsqueda del portal es por metadatos (#13).

Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Nombres distintos para lo mismo entre integrantes, por ejemplo «fecha» y «día»	Media	Medio	Usar los nombres del glosario en todo el código
Cambios de varios integrantes que se pisen entre sí	Media	Medio	Un issue y una rama por historia, y un PR revisado y probado antes de fusionar

Acuerdos de trabajo

- Canal de comunicación: el grupo del equipo.
- Definición de terminado: ver CONTRIBUTING.md.
- Criterio para cambiar el glosario: los nombres del glosario se usan igual en todo el código; cambiarlos sigue lo que dice CONTRIBUTING.md.
- **GitHub Flow:**
  - `main` está protegida.
  - Nada se trabaja sin un issue; si aparece un error, se crea un issue para él.
  - Cada historia empieza desde `main` actualizado, en una rama `feat/<número>-descripcion`.
  - Los commits son pequeños y frecuentes, en español y con Conventional Commits.
  - Hay un PR por historia de usuario, y Jesús lo lee y lo prueba antes de fusionarlo.
- Cualquiera puede crear issues con el mismo formato: texto de la historia y labels de tipo, prioridad y «transversal» cuando aplica.
- Las fechas de las tareas se llevan en el tablero de GitHub: creada, cerrada y fecha límite.
- Las actas se escriben primero en Google Drive y luego se suben a `docs/actas/`, para que la entrega sea un solo enlace.

Backlog inicial

Jesús presentó en el tablero de GitHub las historias HU-01 a HU-21 y las tareas T-01 a T-10. Las tareas son trabajo que no es programación, como el esqueleto del backend o las actas.

Issue	Historia / tarea	Puntos	Prioridad
#1	HU-01 Registro con aviso de privacidad y consentimiento	5	Alta
#2	HU-02 Iniciar, renovar y cerrar sesión con JWT	5	Alta
#3	HU-03 Autorización por roles en API y frontend	5	Alta
#4	HU-04 Ver mis datos y eliminar mi cuenta (Ley 1581)	3	Alta
#5	HU-05 Gestionar ubicaciones (depósito, estantería, caja)	3	Alta
#6	HU-06 Registrar una pieza con código único	5	Alta
#7	HU-07 Listar el inventario con filtros, paginación y orden	5	Alta
#8	HU-08 Ver y editar la ficha interna de una pieza	3	Alta
#9	HU-09 Cargar el escaneo de una pieza con metadatos	8	Alta
#10	HU-10 Control de calidad: aprobar o rechazar escaneos	8	Alta
#11	HU-11 Generar y descargar el QR de una pieza	3	Alta
#12	HU-12 Abrir la ficha pública desde el QR	3	Alta
#13	HU-13 Buscar piezas publicadas por metadatos	5	Alta
#14	HU-14 Ver la ficha pública con visor y ubicación del original	3	Alta
#15	HU-15 Documentos en PDF solo con cuenta y piezas restringidas	3	Alta
#16	HU-16 Aplicar el sistema de diseño	3	Alta
#17	HU-17 Administrar cuentas del personal	5	Media
#18	HU-18 Contadores y avance de digitalización en el inventario	3	Media
#19	HU-19 Lotes de trabajo para voluntarios	8	Baja
#20	HU-20 Imprimir etiquetas QR de varias piezas	3	Baja
#21	HU-21 Asistente de recomendaciones	8	Baja
#22 a #31	T-01 a T-10 Base técnica, datos semilla y documentación de la entrega 1	—	Alta

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Clonar el repositorio y entender la estructura, la Clean Architecture y los roles de la base de datos	Todos	7 de noviembre
Levantar el proyecto en local con Docker	Todos	7 de noviembre
Asignarse las historias en que cada uno va a trabajar	Todos	Antes del 8 de noviembre en la mañana, cuando Jesús revisa las asignaciones
Revisar las historias de usuario y avisar si hay inconsistencias	Todos	—

Compromiso	Responsable	Fecha
Dar acceso al proyecto de GitHub a los integrantes	Jesús Cantillo Guerrero	7 de noviembre, durante la reunión
Escribir al equipo de Introducción para una reunión virtual el lunes	Jesús Cantillo Guerrero	Lunes 9 de noviembre
Hacer el acta de esta reunión	María Gutiérrez	—
